

Housing Authority
Surprise Safety Inspection Programme (SSIP)
Good & Bad Practices for 2025 Q2 & Q3
香港房屋委員會
突擊安全巡查計劃
2025 Q2 & Q3 良好及不良作業




職業安全健康局
OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH COUNCIL

得分一覽

SSIP Median Scores at a Glance





Summary of Good Practices

良好作業摘要

- Good practices were observed including additional guard-rails for fall protection; visualized construction procedures; clear demarcation of pedestrians and vehicles; provision of CMP for real time monitoring; proper arrangement of rest periods for workers; provision of heat stroke prevention equipment, provision of tool strap with appropriate internation/national standards, etc.
- 良好作業包括：加高防護欄杆以防止人體從高處下墮；圖象化的施工程序；清晰的人車分隔；提供綜合管理平臺對工地進行即時監控等；工人休息時間的適當安排；提供防中暑設備；提供符合國際/國家標準的工具手繩。

GOOD PRACTICE 良好作業方式



在矮牆安裝額外的防護欄杆以防止下墮。

Provision of additional guard-rails for fall protection at the parapet wall.



清晰的人車分路設施。

Clear demarcation of pedestrians and vehicles was seen on site.




GOOD PRACTICE 良好作業方式



提供CMP（綜合管理平臺）對工地進行即時監控。

Provision of CMP for real time monitoring.

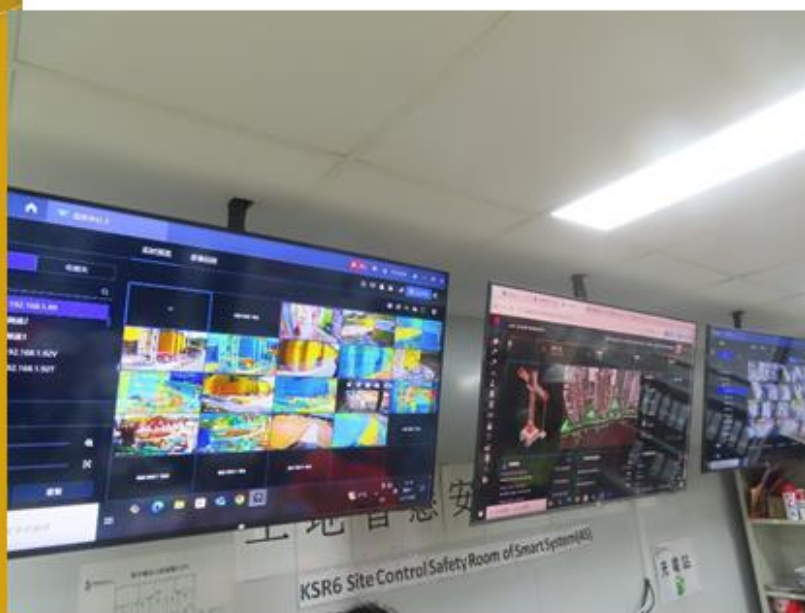

在酷熱天氣下工作，將工友分成不同組別休息。

Workers were divided into assigned groups to take breaks during working in hot weather.



GOOD PRACTICE 良好作業方式



提供符合國際/國家標準的工具手繩，例如ANSI/ISEA 121-2018。

A using tool strap with appropriate international/national standards such as ANSI/ISEA 121-2018 was provided.



GOOD PRACTICE 良好作業方式





在工作位置提供大型風扇。
Provision of large fans at working location.



良好計劃工地內的機械分佈及運輸路線，並圖象化顯示於當眼位置。此外，安排指定管理人員管理不同的分區，並張其負責範圍顯示在計劃內。

A visualized planning for machinery distribution and transport routes at prominent location on the construction site. Additionally, assign designated personnel to manage different zones and incorporate this information into the plan.

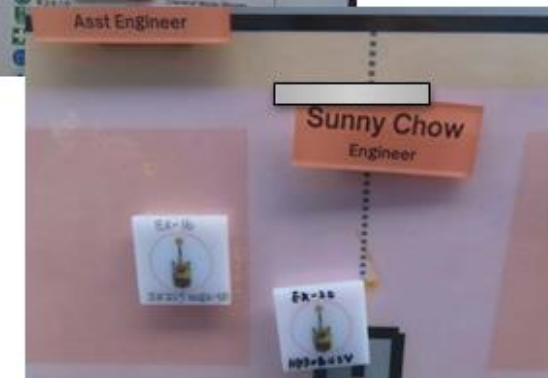



END
完

现在放映的是2025年10月16日

香港房屋委员会

「新工程合约工地安全讲座」的片段

台上的讲者是职业安全健康局高级顾问

许家友先生

他的讲题是

「突击安全巡查计划2025年第2季至第3季巡查结果」

(00:26)

你好

各位房署的同事

多谢你们出席

今天职业安全健康局会和大家分享

突击安全巡查计划在第二季和第三季内

所观察到的承建商表现

也感谢线上的朋友一同收看

我是许家友

事不宜迟，我现在先和大家汇报

承建商在今年第二季和第三季期间

一些承建商在工地安全方面的良好作业范例

以及仍然需要改进的地方

供大家参考

我们先看看分数

整体分数其实都有向下的情况

我们先比较一下第二季和第三季

在第二季，最高分的承建商是93分

最低分是70分

上四分位数是86分

下四分位数是79分

中位数是84分

但到了第三季

要注意的是，整体有轻微下跌

最高分是91分

上四分位数仍然是86分

中位数下跌了1分

下四分位数是79分

而最低分则跌至66分

让我们看看一些实际的现场情况

有些承建商做得不错，值得一赞

例如一些高空工作方面

如果原有护栏高度不足

会主动加高围栏

确保其高度符合900至1,150毫米的标准要求

在人车分流方面，采用了图像化的施工程序说明

使人车分隔的布局非常清晰易懂

还有，有些工地已正式投入使用
综合管理平台和安安全智慧工地系统
另外，在第二季和第三季
天气比较炎热
有些工地设有很清晰的休息安排
包括大型风扇等设备

还有，也有使用符合标准的工具手绳

我们看看相片
例如左边那些较高的位置
如果矮墙高度不足
会有下堕风险
承建商便会加设围栏

在人车分流方面，人车分路设施也非常清晰
承建商也有使用综合管理平台
大家可以看到
系统能清楚标示
各组别工友的人员名单及其对应的休息时间安排等
另外，这一季也开始
使用符合标准的工具手绳
以防止工具造成物料下堕的风险
还有因应炎热天气
一些工地会增设大型风扇

另外，有一些图像化的安排
例如工地平面图、运输路线
机械分配位置图等等

多谢大家

谢谢观看

(03:06)
